

**Ejecución de  
Proyectos del  
Presupuesto  
Participativo  
Regional  
2009**

**(Avance al Primer Semestre 2009)**

**Segundo Informe**

**PIURA  
Noviembre de 2009**


## I. Ejecución de Inversiones del GRP al Primer Semestre 2009<sup>1</sup>

### 1.1. Presupuesto y ejecución de Inversiones del GRP al primer semestre 2009

Al primer semestre del 2009, el presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Piura fue de **S/.378'936,968 nuevos soles**, cifra muy superior al presupuesto de inversiones del año 2008. En este primer semestre éste presupuesto se destina al financiamiento de 194 proyectos en diferentes zonas del departamento de Piura.

#### Por Unidades Ejecutoras

El presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional de Piura se distribuye en nueve (9) unidades ejecutoras para que éstas se encarguen de ejecutarlo. La principal unidad ejecutora - por el monto que tiene presupuestado - es la Sede Piura con S/.135 millones, es decir el 36% del total; seguida del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura que cuenta con un importante presupuesto siendo el 29% del total. (Ver Gráfico N° 1)

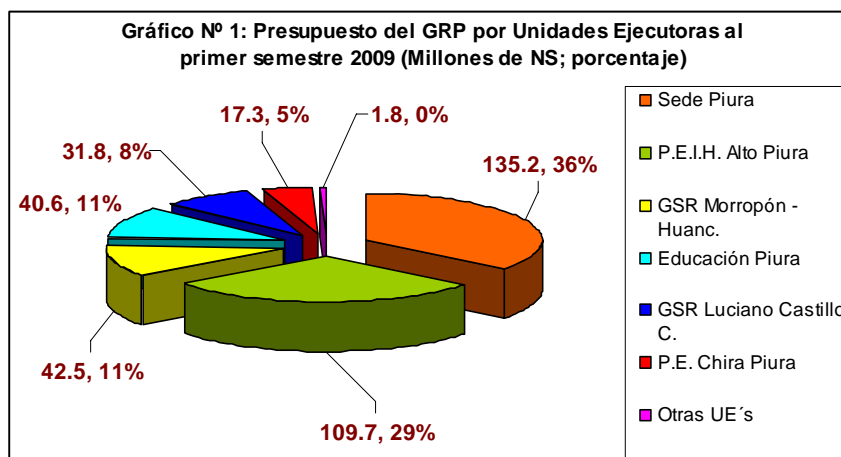

Las unidades ejecutoras que cuentan con menor presupuesto son la Dirección Regional de Salud con S/.1.6 millones, Dirección Regional de Agricultura S/.169,315 y la Dirección Regional de Transportes con S/.124,346.

#### Por Funciones

El 36% del presupuesto de Inversiones la primer semestre del año es destinado a la función Agropecuaria siendo la mayor parte para el proyecto de Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura con S/.108 millones, seguido del proyecto Sifón Sojo y Sifón Chira III Etapa – Liquidación con S/.10 millones.

La segunda función con mayor asignación es Educación con un presupuesto de S/.72 millones de los cuales S/.40.5 millones corresponde a lo institutos de educación superior que reciben recursos del canon petrolero (22 proyectos de institutos). Aparte de estos, el proyecto de importante presupuesto es el de la Construcción de Infraestructura de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Paita con S/.8 millones.

Como se observa en el Cuadro N° 1, las funciones de menor asignación de presupuesto son Turismo con un solo proyecto en la Sede Piura denominado Mejoramiento de la actividad Artesanal integrándola al Turismo en el distrito de Catacaos con S/.660 mil; Defensa y Seguridad Nacional con el proyecto Rehabilitación Carretera Sullana-Paita Afectada por Lluvias Intensas por S/.124 mil; y

<sup>1</sup> Participaron activamente en la elaboración de este informe, el Sr. Antenor Sihuay Vilchez (Federación de Trabajadores de Construcción Civil – Región Piura), Sr. Alexander Pasapera Villegas (Junta de Usuarios del Distrito de Riego San Lorenzo), y Sr. Enrique Carrasco Morales (APEMIPE – Piura). El Sr. César Agustín Benites Laureano (Asociación Comisión de Regantes “Valle de los Incas”) se excusó de participar ya que en su organización no le autorizaron seguir representándolos al haberse elegido nueva directiva.

Comunicaciones con el proyecto Extensión del Servicio de Telefonía Fija Modalidad Abonados, Telefonía Fija Pública y Telefonía Móvil para Brindar Cobertura en Zonas Rurales con S/.100 mil.

Una de las funciones de mayor ejecución presupuestal es Cultura y Deporte con el 84% de avance pero que sólo tiene S/.2.8 millones de presupuesto para la ejecución de dos proyectos: la Puesta en valor del Monumento Histórico Santísima Cruz del Norte y el Mejoramiento del Estadio Sesquicentenario de Sechura.

De las funciones que muestran menor ejecución presupuestal y a su vez mayor presupuesto asignado tenemos a Educación ya que los institutos tienen serios problemas de gestión y ejecución de sus proyectos siendo los que más presupuesto en conjunto acumulan; así como la Agropecuaria ya que es poca la ejecución de su principal proyecto, el Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura que sólo ha gastado el 1% de su presupuesto.

**Cuadro Nº 1: Presupuesto de Inversiones del GRP por Funciones, al primer semestre 2009 (Nuevos Soles)**


Funciones	PIA	PIM	Ejecución	Avance Financiero
Agropecuaria	26,995,404	138,143,081	21,020,359	15%
Educación	24,245,138	72,569,206	5,698,350	8%
Saneamiento	4,835,962	56,378,957	23,458,378	42%
Transporte	28,009,511	50,849,860	9,859,519	19%
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	15,413,759	25,965,424	14,331,364	55%
Salud	5,171,308	10,894,416	3,020,705	28%
Energía	1,041,716	8,444,402	873,671	10%
Protección Social	1,000,000	5,375,216	2,071,418	39%
Orden Público y Seguridad	5,500,000	3,691,262	0	0%
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,824,128	2,960,548	0	0%
Cultura y Deporte	2,160,000	2,779,411	2,343,468	84%
Turismo	0	660,839	0	0%
Defensa y Seguridad Nacional	0	124,346	122,957	99%
Comunicaciones	100,000	100,000	0	0%
<b>Total General</b>	<b>117,296,926</b>	<b>378,936,968</b>	<b>82,800,189</b>	<b>22%</b>

Fuente: Gobierno Regional de Piura

Elaboración: Propia

#### Por provincias.-

La provincia que mayor presupuesto de Inversión concentra es Huancabamba con S/.115 millones entre 2º proyectos, de los cuales S/.98.9 millones son del proyecto de Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y el Túnel de Traslase. La provincia de Piura concentra el 24% del presupuesto con 92 proyectos muchos de ellos con presupuestos muy pequeños, mientras que el de mayor monto es Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de La Arena con S/.16 millones. Las provincias que menor asignación tienen son Ayabaca con apenas el 4% (S/.11 millones para 20 proyectos) y Sechura con el 3% (S/.9.8 millones para 9 proyectos).

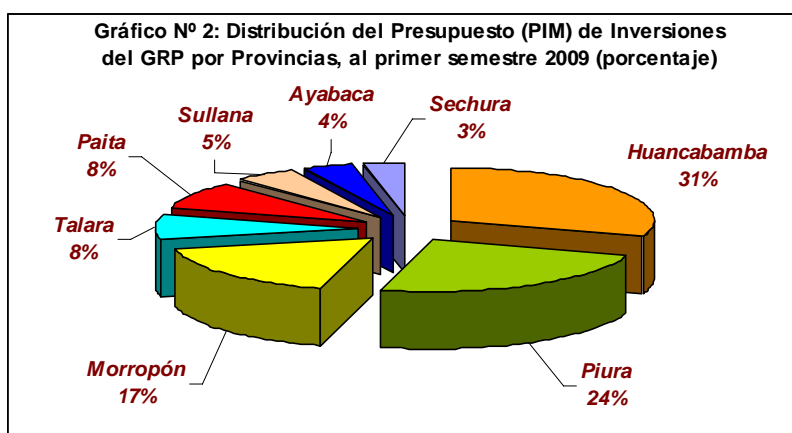

La provincia que mayor presupuesto de Inversión concentra es Huancabamba con S/.115 millones entre 2º proyectos, de los cuales S/.98.9 millones son del proyecto de Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y el Túnel de Traslase. La provincia de Piura concentra el 24% del presupuesto con 92 proyectos muchos de ellos con presupuestos muy pequeños, mientras que el de mayor monto es Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de La Arena con S/.16 millones. Las provincias que menor asignación tienen son Ayabaca con apenas el 4% (S/.11 millones para 20 proyectos) y Sechura con el 3% (S/.9.8 millones para 9 proyectos).

## 1.2. Avance de ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo Regional 2009

Fueron 71 los proyectos calificados en el taller de priorización según los criterios establecidos por el Equipo Técnico y las normas vigentes<sup>2</sup>.

Durante la etapa de discusión y aprobación en Consejo Regional de Piura se incluyeron 6 más totalizando 77 proyectos, de los cuales 23 eran estudios de preinversión. Finalmente, en el Presupuesto Institucional de Apertura sólo se registran 22<sup>3</sup> de estos proyectos.

Según el GRP, los cambios se produjeron porque los alcaldes llegaron posteriormente con documentos demostrando la viabilidad o el cofinanciamiento, por lo cual se incrementó la calificación.<sup>4</sup>

### Proyectos en Ejecución.-

Según la información proporcionada por el Gobierno Regional de Piura, al primer semestre del 2009, de los 71 proyectos aprobados en el proceso de presupuesto participativo regional 2009, sólo **uno** se encuentra en ejecución, la Rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos IRHS 20-24-25-27-35-40-189-190-224-771-812-838-842 Sector Charanal (Chulucanas) cuyo presupuesto es de 100,710 soles, y cuya ejecución financiera es de 100% al haberse hecho el desembolso total de la obras, sin embargo al culminar el primer semestre no tiene avance físico.

### Proyectos en proceso de convocatoria (por iniciar).-

**Tres** proyectos del aprobados en el proceso de presupuesto participativo regional 2009 se encuentran en situación “por iniciar” al primer semestre de este año. (Ver Cuadro N° 2). Asimismo, se observa, que en los tres casos, a cada proyecto se le ha asignado un presupuesto (PIM) menor al costo estimado. En conjunto, el costo estimado de estos tres proyectos es de S/.5.2 millones.

**Cuadro N° 2: Proyectos del PPR 2009 por iniciar al 1er Semestre 2009 (Nuevos Soles)**

Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Costo estimado	PIA	PIM	Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico
<b>Por iniciar (en proceso de convocatoria)</b>								
Electrificación de caserío CP2 Colera - Tambogrande	Piura	Tambo-grande	1,521,605	586,420	1,472,140	0	0%	0%
Mejoramiento de Sistema de Riego del Canal Jíbito Margen Izquierda del Río Chira - Distrito Miguel Checa	Sullana	Miguel Checa	2,052,632	886,420	1,000,535	0	0%	0%
Sustitución y mejoramiento de la infraestructura educativa en la I.E N° 14007 Urb. Piura	Piura	Piura	1,608,013	386,420	1,460,548	0	0%	0%

Fuente: Gobierno Regional de Piura

Elaboración: Propia

### Proyectos a nivel de Expediente Técnico.-

**Trece** proyectos aprobados en el proceso de presupuesto participativo regional 2009, se encuentran en situación de “expediente técnico”. El costo estimado total de todos estos proyectos es de S/.27.6 millones.

<sup>2</sup> A cada proyecto se le asignó un puntaje de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Equipo Técnico y la normatividad vigente.

<sup>3</sup> Ver Anexo 1.

<sup>4</sup> Boletín de Vigilancia N° 2: Presupuesto Participativo Regional 2009 - Piura. CIPCA - Vigila Perú. Julio 2009.

Se observa que uno de los proyectos tiene un presupuesto de tan sólo S/.76,879 correspondiendo a la Rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos IRHS 220 I-334-360-446-447-631-684-70 del Sector Yapatera, y cuyo expediente técnico se encuentra en situación de revaluación.

Según la información del Gobierno Regional de Piura tres proyectos tienen presupuesto de sus respectivas municipalidades provenientes del FONIPREL, siendo estos: Mejoramiento de la Infraestructura del sistema de riego menor en el distrito de Bellavista de La Unión que tiene un costo de S/.4.4 millones, Mejoramiento de la carretera La Unión - Villa Monte Redondo en el distrito de La Unión cuyo costo es de S/.2.1 millones, y Mejoramiento de Canal de Riego Llícuar - Progresiva Km. 3+385 al Km. 7+385, distrito de Rinconada de Llícuar con un costo de S/.4.3 millones (este último ha sido presentado a concurso del FONIPREL por la municipalidad de Rinconada de Llícuar).

Estos proyectos cuentan con la posibilidad de financiarse de otra fuente que no proviene del Gobierno Regional, por lo que al primer semestre del 2009, el GRP no les ha asignado un presupuesto PIM, tal como se observa en el Cuadro N° 3.

**Cuadro N° 3: Proyectos del PPR 2009 con Expediente Técnico al 1er Semestre 2009**

Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Costo estimado	PIA	PIM	Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico
<b>A nivel de expediente técnico</b>								
Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la institución educativa Túpac Amaru, distrito de Frías	Ayabaca	Frías	3,100,492	386,420	70,584	0	0%	0%
Ampliación, remodelación y equipamiento del establecimiento de salud I-3 San Juan de Bigote	Morropón	San Juan de Bigote	1,469,831	684,888	1,490,231	0	0%	0%
Construcción de la infraestructura de captación de aguas subterráneas para el riego de los sectores Yapatera, Charanal, Sancor y Vicús	Morropón	Chulucanas	2,566,745	400,464	400,464	0	0%	0%
Construcción de Muro de contención del AAHH Las Mercedes, provincia de Talara	Talara	Negritos	1,997,628	386,420	386,420	0	0%	0%
Construcción de puente carrozable Jambur - Paimas - Ayabaca	Ayabaca	Paimas	2,597,888	386,421	386,421	0	0%	0%
Construcción y equipamiento de la I.E. N° 14325 Nivel Primaria - Reverendo Padre Migue Anselmo Córdova Chumacero, Distrito de Frías	Ayabaca	Frías		386,420	27,000	0	0%	0%
Mejoramiento de la Infraestructura del sistema de riego menor en el distrito de Bellavista de La Unión	Piura	Bellavista de la Unión	4,389,479	886,420	0	0		0%
Mejoramiento de la carretera La Unión - Villa Monte Redondo en el distrito de La Unión	Piura	La Unión	2,145,180	386,420	0	0		0%
Mejoramiento de la Infraestructura educativa en la IE N° 14063 - Monte Redondo	Piura	La Unión	1,889,939	386,420	0	0		0%
Mejoramiento de Canal de riego Llícuar - Progresiva Km 3+385 al Km. 7+385, distrito de Rinconada	Piura	Rinconada Llícuar	4,321,575	886,420	0	0		0%
Mejoramiento y ampliación de la IE N° 14126 Caserío Vichayal, distrito de La Arena	Piura	La Arena	2,041,806	386,420	1,204,073	0		0%

Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Costo estimado	PIA	PIM	Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico
Reacondicionamiento de caja y ampliación de alcantarillas en el Dren Cieneguillo, Centro Sullana	Sullana	Sullana	1,033,227	386,420	0	0		0%
Rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos IRHS 220 I-334-360-446-447-631-684-70 Sector Yapatera	Morropón	Chulucanas	76,879	386,420	73,032	0	0%	0%

Fuente: Gobierno Regional de Piura

Elaboración: Propia

### Proyectos a nivel de Pre – Inversión.-

*Dos* proyectos aprobados en el proceso de presupuesto participativo regional 2009, se encuentran a nivel de Pre-Inversión, siendo:

- ❖ Ampliación de infraestructura y equipamiento para mejorar acciones de promoción, prevención y recuperación con énfasis a la madre y el niño en el Centro de Salud de La Unión. Costo estimado: S/.1´383,161.
- ❖ Sistema de agua potable e instalación de letrinas en los centros poblados de Progreso Alto, Progreso Bajo y Punta Arenas del Distrito de Tambogrande. Costo estimado: S/.2´669,271.

Según se observa, ambos proyectos tienen un presupuesto asignado al primer semestre de este año que asciende a S/.386,420.

### Proyectos incluidos por el Congreso de la República.-

Como puede observarse en el Cuadro N° 4, el proyecto de mayor envergadura es el Mejoramiento de la Carretera Mallares - Centro Poblado El Angolo - Distrito de Marcavelica al cual se le asigna un presupuesto inicial de S/.4.0 millones.

De este proyecto encontramos que en el mes de enero de este año se le aprobó por el Fondo de Promoción Regional y Municipal (FONIPREL) un presupuesto de S/.13´266,942, siendo el de mayor asignación del total del fondo que ascendió a S/.45 millones.

Este tramo es parte del Eje Vial 02 que une Sullana – Alamor, y según lo señalado por el presidente regional es parte del apoyo del gobierno central en la Región para generar obras que permitan que mas personas tengan accesos a servicios básicos y de Educación. También al mejoramiento de la infraestructura de riego.<sup>5</sup>

En total, este paquete de proyectos incluidos por el Congreso de la República sumó un monto de presupuesto inicial (PIA) de S/.7´543,819, mientras que el presupuesto modificado al primer semestre fue de S/.2´322,546. Ninguno de ellos muestra ejecución física ni financiera.

**Cuadro N° 4: Proyectos incluidos por el Congreso de la República en el Programa de Inversiones 2009 (ejecución al primer semestre)**

Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Costo estimado	PIA	PIM	Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico
<b>A nivel de expediente técnico</b>								
Ampliación y mejoramiento de la infraestructura de la I.E. Almirante Miguel Grau - Tablazo Norte La Unión	Piura	La Unión	2,073,013	2,073,013	100,000	0	0%	0%

<sup>5</sup> [http://www.elregionalpiura.com.pe/archivonoticias\\_2009/enero\\_2009/enero\\_21/regionales\\_21d.htm](http://www.elregionalpiura.com.pe/archivonoticias_2009/enero_2009/enero_21/regionales_21d.htm)

Nombre del Proyecto	Provincia	Distrito	Costo estimado	PIA	PIM	Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico
Fortalecimiento de capacidades en las áreas de comunicación integral y lógico matemático de los estudiantes de las instituciones educativas (inicial y primaria) de las localidades ubicadas en el Quintil 2 de la provincia de Morropón	Sechura	Multi-distrital	500,000	500,000	500,000	0	0%	0%
Fortalecimiento de capacidades en las áreas de comunicación integral y lógico matemático de los estudiantes de las instituciones educativas (inicial y primaria) de las localidades ubicadas en el Quintil 1 de la provincia de Morropón	Morropón	Multi-distrital	1,252,160	500,000	1,251,740	0	0%	0%
Mejoramiento de infraestructura educativa en centro de educación básica especial Castilla AA.HH. Juan Pablo II - distrito de Castilla	Piura	Castilla	355,910	355,910	355,910	0	0%	0%
Mejoramiento de la carretera Mallares - Centro Poblado El Angolo - Distrito de Marcavelica	Sullana	Multi-distrital	17,865,942	4,000,000	0	0	0%	0%
Reconstrucción de infraestructura y equipamiento de la institución educativa N° 20804 del Sector Mangal de Calvas - Comunidad Campesina Samanga - Ayabaca	Ayabaca	Ayabaca	114,896	114,896	114,896	0	0%	0%

Fuente: Gobierno Regional de Piura

Elaboración: Propia

## ***II. Seguimiento a proyectos del Gobierno Regional de Piura***

### **Proyecto: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa de los Servicios Básicos del establecimiento de Salud I-4 Bellavista. Micro Red Bellavista, Red Sullana”**

Según el portal electrónico del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP<sup>6</sup>, este proyecto consiste en la Rehabilitación, Remodelación y Ampliación de la infraestructura actual, adquisición de equipos suficientes y modernos, elaborar y ejecutar un Programa de Capacitación para el personal del Centro de Salud y para los Agentes Comunitarios. La Inversión Total es de 2'350,406 nuevos soles

Según información que nos ha proporcionado el GRP, el valor referencial base de la obra es de S/.2'640,194.79 (precios a marzo del 2008) y la fuente de financiamiento es el Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

El proceso de selección se hizo por Licitación Pública N° 004-2008/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G bajo el sistema de Suma Alzada; siendo la ganadora la contratista Consorcio Bellavista 2.

El plazo ofertado fue de 120 días calendarios, siendo firmado el contrato en la fecha de 27 de Noviembre de 2008; la fecha de entrega del terreno el día 12 de Diciembre de 2008 y la fecha de inicio de la obra el 10 de febrero de 2009. Según la información, la fecha de culminación es el 16 de octubre de 2009.

<sup>6</sup> <http://www.mef.gob.pe/DGPM/snipnet.php?mensaje=si>

Asimismo, se observa que a esta obra se dieron 05 ampliaciones de plazo aprobadas por 75 días calendarios. Y una Ampliación de plazo por Adicional de Obra de 54 días calendarios por un monto de S/.68,764 incluido IGV con precios vigentes al mes de marzo de 2008.

El monto total valorizado y cancelado al contratista es de S/.1´447,417.96 hasta el 31 de Agosto de 2009 siendo el avance físico del 50.24%.

Al 30 de Junio, según el Programa de Inversiones del GRP el proyecto tiene un presupuesto modificado de 2´579,000 de los cuales se ha ejecutado S/.1´334,000, es decir el 52%, habiendo un saldo presupuestal de S/.1´245,000.

Según lo informado por el GRP, el análisis del estado situacional de la obra es:

- ❖ El avance físico – financiero actual se estima en un 53%.
- ❖ La obra se encuentra en ejecución.
- ❖ La demora presentada en la ejecución de obra es debido a que en la zona donde se desarrolla la obra existe 13 grupos vandálicos presentándose en forma constante y permanente lo siguiente:
  - Clima de violencia, amenazas y hostilidades,
  - Agresión física hacia el personal que se encuentra en obra,
  - Moradores entorpecen trabajos y amenazan con violencia
  - Hostilidades y violencia por parte de los vándalos exigiendo más cupos de trabajo
  - Suceden robos de material y hostilidades contra el personal que se encuentra trabajando.

---

### **Proyecto: “Redimensionamiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo III, Sullana”**

---

Este proyecto tiene asignado un presupuesto inicial (PIA) para el 2009 de S/.1´000,000, de los cuales al primer semestre no se han ejecutado.

Según la información del portal del SNIP, el proyecto busca dar solución a la deficiente prestación de salud del Hospital de Sullana, esto debido a la insuficiente capacidad operativa y de resolución de la oferta hospitalaria, con relación a las condiciones de la oferta existente en la región; y tiene como objetivo Mejorar la capacidad resolutoria del segundo nivel de complejidad en los servicios de salud en la Sub-Región de Salud Luciano Castillo Colonna.

La alternativa del proyecto contempla la construcción de un nuevo Hospital de Apoyo Sullana. Luego del estudio integral del actual inmueble se ha podido comprobar que las ampliaciones, remodelaciones y la intervención en el cambio de las instalaciones principales no resolverían la problemática relacionada con el servicio que se presta a los usuarios que acceden al hospital, siendo necesario la intervención de una *nueva construcción del hospital*, en una zona distinta a la actual, que de solución integral a la actual situación del establecimiento.

El monto de la inversión total es de S/.80´136,974 y a la fecha 22 de Abril de 2009 está en situación de Aprobado a nivel de factibilidad por la OPI de la Región Piura<sup>7</sup>.

---

### **Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Riego Canal El Mango – Bazán, distrito de Rinconada Llícuar, provincia de Sechura**

---

Según la información del portal del SNIP, la inversión total de éste proyecto es de S/.2´865,993.

---

<sup>7</sup> Con Informe Técnico N° 003-2009/GRP-410100-410110-JCAÑ-IRPR-EMA-EVAL del 21/04/09 se Aprueba la Factibilidad.

Su ejecución se inició en el 2008 donde se presupuestó 1´400,000 de soles y se ejecutó S/.1´000,000. Para este año, se tiene que el presupuesto modificado (PIM) fue de S/.1´440,011 de los cuales se gastó el 100%. Es decir, en total se ha desembolsado por este proyecto el monto de S/.2´440,011.

Sin embargo, según la información del GRP, a Julio del 2009 hay un saldo presupuestal de S/.397,577 y está en proceso de ejecución. La modalidad es por encargo - Contrata UNPOS.

Entre las observaciones que se presenta: se formuló el expediente con un monto excedente de S/.525,444.93 el cual se ha solicitado la certificación presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. El 26 de junio se entregó la Resolución de aprobación del Expediente Técnico reformulado y entrega de Expediente Técnico en físico.

---

### **Proyecto: Mejoramiento de la Carretera Departamental Chulucanas – Tambogrande (Primera Etapa)**

---

Este proyecto ha estado en el Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Piura desde el año 2007 donde se le asignó un presupuesto de 10.5 millones de soles financiados íntegramente con la fuente Recursos Ordinarios, sin tener ejecución financiera ni física.<sup>8</sup>

Para su implementación se realizó un proceso de licitación pública, en la que resultó ganador el Consorcio Vial Piura con una oferta económica de S/.17´815,100.84 que incluye impuestos de ley.<sup>9</sup>

El proyecto se ubica en la región Piura, Provincia de Morropón, distritos de Chulucanas y Tambogrande; centros poblados de Pacchas, Sol Sol, Yapatera, San Francisco, Las Mónicas, Malingas, La Pala, San Isidro y CP 8.

El valor referencial total del proyecto fue de S/.16´497,777.11, y se estableció un plazo para ejecución de 480 días calendario.<sup>10</sup> Según la ficha técnica del SNIP, prevé el mejoramiento de 33.8 Kms. de la carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 0.05 mts. de espesor y obras de arte adicionales (alcantarillas, puentes, portones).

Para el año 2009 se le asignó un monto de S/.2.5 millones de presupuesto inicial (PIA) y al mes de abril el presupuesto modificado (PIM) era de S/.20´873,096.<sup>11</sup>

Asimismo, según la información que proporcionó el GRP<sup>12</sup>, al mes de agosto de 2009 el avance financiero total del proyecto es de 46% mientras que el avance físico programado es de 32.51% y el avance físico real es de 31.73%.

Según las observaciones que informan, la obra está en ejecución y se encuentra atrasada en un 0.78%, existe un calendario acelerado en proceso de aprobación, el ritmo de trabajo es lento, por lo que se exige la aceleración del mismo. El porcentaje de avance físico está en función del calendario acelerado.

---

<sup>8</sup> Reporte N° 14, Balance 2007 del Proceso de Descentralización en Piura. CIPCA-Vigila Perú. Marzo de 2008.

<sup>9</sup> 28 de Noviembre de 2007.

<sup>10</sup> Reporte N° 14, Balance 2007 del Proceso de Descentralización en Piura. CIPCA-Vigila Perú. Marzo de 2008.

<sup>11</sup> Estado situacional de los proyectos del Presupuesto Participativo Regional 2009 aprobados mediante Ley N° 29289 del sector público del año fiscal 2009.

<sup>12</sup> Información específica de proyectos presentada por el Gobierno Regional de Piura al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Regional 2009.

### ***III. Directiva para la conformación de Comités de Obras***

Como un aporte del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo Regional 2009 para su labor y la de futuros comités conformados, se ha elaborado una propuesta de directiva para la conformación de Comités de Obra. A continuación presentamos la propuesta planteada que el comité ha hecho llegar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Piura para su revisión, mejoras y aprobación.

#### **Mecanismo de Conformación de Comités de Obra** (Versión Preliminar del Proyecto)

##### **Marco Legal**

- ❖ Constitución Política del Perú
- ❖ Ley N° 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadana
- ❖ Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
- ❖ Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- ❖ Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo
- ❖ D.S. N° 171-2003-EF, Reglamento de la Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo
- ❖ Instructivo N° 002-2008-EF/76.01 del Proceso de Presupuesto Participativo
- ❖ Ordenanza Regional N° 146-2008 /GRP-CR que aprueba el Reglamento para el Desarrollo del Presupuesto Participativo 2009 en el Gobierno Regional de Piura
- ❖ Resolución Ejecutiva Regional N° 554-2008/Gobierno Regional de Piura-PR, que aprueba el Instructivo Mecanismos de Participación del Comité de Vigilancia en el Proceso Participativo del Gobierno Regional Piura
- ❖ Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado

##### **Objetivo**

De conformidad a las normas emitidas por los órganos del estado respectivo, es necesaria la conformación de los Comités de Obra.

##### **Considerando**

Que según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificación en el Artículo 15, Inciso a., señala la atribución del Consejo Regional de aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional.

La Ley N° 28506 Marco del Proceso de Presupuesto Participativo y su modificatoria en el Artículo 1, define el Proceso de Presupuesto Participativo como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de recursos públicos que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil.

Que el Reglamento para el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 en el Gobierno Regional de Piura en su Capítulo X, Artículo 20, en el penúltimo párrafo dice: “los beneficiarios de los proyectos pueden constituir Comités de Vigilancia por Obra, con el fin de apoyar la labor de vigilancia que desarrolla el Inspector o Supervisor de Obra de acuerdo al Artículo 247 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

Que el Instructivo del “Mecanismo para la participación del Comité de Vigilancia en el Proceso de Presupuesto Participativo del Gobierno Regional”, Resolución Ejecutiva Regional N° 554, Artículo 9 dice que si los integrantes tanto públicos como privados lo consideren pertinente, las tareas del Comité de Vigilancia pueden ser encargadas con el fin de apoyar a los Inspectores o Supervisores de Obra de Acuerdo al Artículo 247 del reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, los beneficiarios de los proyectos pueden constituir Comités de Vigilancia de Obra.

La opción de la conformación de Comités de Vigilancia de Obra es para promover la participación ciudadana con equidad de oportunidad e igualdad.

El Comité de Obra debe estar conformado por cuatro (4) integrantes:

- ❖ Un responsable formulador del proyecto
- ❖ Un responsable de la ejecutora de la Obra (Supervisor o Inspector)
- ❖ Un responsable de los trabajadores (comité de obra)
- ❖ Un responsable de los beneficiarios (sociedad civil)

Los cuatro (4) integrantes del Comité de Obra en reunión con el Comité de Vigilancia y Control Regional elaborarán coordinadamente su informe según el avance de la obra el mismo que será elevado y presentado en sesión de Consejo de Coordinación Regional. Al respecto, el Reglamento para el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 en su Artículo 30 indica como función del Comité de Vigilancia y Control Regional, informar al Consejo de Coordinación Regional sobre los resultados de su vigilancia.

**Por tanto:**

Es necesaria y oportuna la conformación de los Comités de Obra para el apoyo de las tareas del Comité de Vigilancia y Control Regional, otorgando la facultad de conformación de dichos actores.

#### ***IV. Conclusiones y Recomendaciones***

Desde el GRP, se deben buscar los mecanismos adecuados para que la ejecución de proyectos del presupuesto participativo regional 2009 sea transparente y que la información llegue a un mayor número de ciudadanos.

El GRP debe coordinar con los comités de vigilancia y que la información les sea accesible. No se ha diseñado una política de transparencia con la sociedad civil para que esta pueda acceder a información de mayor nivel y detalle. Por ello, no se puede contar con mayor información precisa y detallada de las obras que se vienen ejecutando.

Existen dificultades de logística y presupuestales para cumplir con las labores y funciones de los comités de vigilancia.

Es prioritario incluir en el presupuesto de inversiones, recursos para el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil que participan o pueden participar en los procesos de presupuesto participativo regional.

Respecto al Equipo Técnico del presupuesto participativo, observamos debilidad en su participación y capacidades técnicas. Se debió seleccionar a personas de mayor capacidad técnica en el tema.

Por ello planteamos que haya una mayor representación de la sociedad civil en los Equipos Técnicos de los procesos de presupuesto participativo regional ya que en su mayor parte están integrados por funcionarios del GRP.

Observamos que el Consejo Regional de Piura nunca ha emitido una norma sobre el tema de vigilancia ciudadana. Hay muy poco interés y trabajo de los consejeros por este tema.

No se observa un interés y compromiso de los colegios profesionales para participar en la vigilancia de los proyectos del GRP. Sin embargo, se reconoce que muy poco acercamiento han tenido los comités con estos colegios, por lo que debería tenerse una mayor relación y articulación para trabajar juntos.

Proponemos la elaboración de una propuesta de ordenanza a través de la cual a los consejeros se les obligue tener mayor participación y trabajo para el fortalecimiento de los procesos de presupuesto

participativo regional. Asimismo, que puedan asesorar a la sociedad civil que participa en los equipos técnicos y así mejorar su accionar.

Proponemos la conformación de una Mesa de comités de vigilancia que cumpla una labor orientadora, de soporte y asesoría a los comités vigentes y que además haga vigilancia ciudadana permanente al buen uso de los recursos públicos.

Proponer al Gobierno Regional de Piura un cronograma de reuniones de trabajo con los integrantes del Equipo Técnico, Consejo de Coordinación Regional, Comités de Vigilancia y representantes de la Sociedad Civil como agentes participantes.

Proponer la mejora del proceso de inscripciones al registro de agentes participantes del proceso de presupuesto participativo regional.

Reiteramos nuestra recomendación que hicimos en nuestro primer informe de diciembre de 2008 de cumplir con el cronograma de capacitación a los agentes participantes durante el proceso de presupuesto participativo regional de manera descentralizada y que este se inicie desde el mes de enero.

## ANEXOS

### Anexo 1: Proyectos priorizados en el Proceso de Presupuesto Participativo 2009 e Incluidos en el Presupuesto Institucional de Apertura de Inversiones 2009.

Prioridad según el PP 2009	Nombre del Proyecto	PIA	PIM	Ejecución-Devengado	Avance %
<b>SEDE PIURA</b>					
<b>F. Agropecuaria</b>					
1	Mejoramiento de infraestructura de sistema de riego menor en el distrito de Bellavista de la Unión, provincia de Sechura - Piura	886,420	0	0	0.0
1	Mejoramiento del canal de riego Llícuar-Progresiva km. 3+385 al km. 7+385 - distrito de Rinconada Llícuar, provincia de Sechura - Piura	886,420	0	0	0.0
2	Mejoramiento y revestimiento de los canales de riego Carmen Benitez, Letirá Grande, Letirá Chico del distrito de Vice, provincia de Sechura - Piura	886,420	1,131,786	1,131,786	100.0
<b>F. Energía</b>					
1	Electrificación caserío CP 2 Cólera - Tambogrande	586,420	1,472,840	0	0.0
1	Electrificación CP San Martín CP 3 -Tambogrande	455,296	4,480,276	0	0.0
<b>F. Transporte</b>					
1	Mejoramiento de la carretera la Unión Villa Monte Redondo, distrito de la Unión, provincia de Piura - Piura	386,420	0	0	0.0
<b>F. Saneamiento</b>					
2	Sistema de agua potable e instalación de letrinas en los centros poblados de Progreso Alto, Progreso Bajo y Punta Arenas del distrito de Tambogrande - provincia de Piura	386,420	386,420	0	0.0
<b>F. Salud</b>					
1	Ampliación de infraestructura y equipamiento para mejorar acciones de promoción, prevención y recuperación con énfasis a la madre y el niño en el Centro de Salud la Unión	386,420	386,420	0	0.0
<b>F. Educación</b>					
1	Mejoramiento de la infraestructura educativa en la I.E. N° 14063 - Monte Redondo, distrito de la Unión, provincia de Piura	386,420	1,204,072	0	0.0
2	Mejoramiento y ampliación de la I.E. N° 14126 caserío Vichayal - distrito la Arena, provincia de Piura - Piura	386,420	1,204,073	0	0.0
5	Sustitución y mejoramiento de la infraestructura educativa en la I.E. N° 14007 Urbanización Piura - distrito de Piura - Piura	386,420	1,460,548	0	0.0
<b>GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA</b>					
<b>F. Agropecuaria</b>					
1	Mejoramiento del sistema de riego del canal Jíbito margen izquierda del Río Chira - distrito Miguel Checa - Sullana - Piura	886,420	1,900,535	0	0.0
1	Reacondicionamiento de caja y ampliación de alcantarillas en el Dren Cieneguillo Centro - Sullana	386,420	0	0	0.0
<b>F. Transporte</b>					
1	Construcción de puente carrozable Jambur -Paimas, provincia de Ayabaca - Piura	386,421	386,421	0	0.0
<b>F. Vivienda y Desarrollo Urbano</b>					

2	Construcción de muro de contención en el AA.HH. Las Mercedes, provincia de Talara - Piura	386,420	386,420	0	0.0
<b>F. Salud</b>					
5	Mejoramiento de la capacidad operativa de los servicios básicos del Establecimiento de Salud I-4 Bellavista, Microred Bellavista, Red Sullana, Región Piura	1,000,000	2,579,000	755,545	29.3
<b>GERENCIA SUB-REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA</b>					
<b>F. Agropecuaria</b>					
1	Rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos IRHS 20-24-25-27-35-40-152-189-190-224-771-812-813-838-842 sector Charanal	386,420	97,182	60,426	62.2
1	Rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos IRHS 220 i -323-354-360-446-447-631-684-70 sector Yapatera	386,420	76,560	0	0.0
2	Construcción de la infraestructura de captación de aguas subterráneas para el riego de los sectores: Yapatera, Charanal, Sancor y Vicús, distrito Chulucanas, provincia de Morropón - Piura	400,464	400,464	0	0.0
<b>F. Salud</b>					
3	Ampliación, remodelación y equipamiento del establecimiento de Salud I-3 San Juan de Bigote, en el distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón - Región Piura	684,888	1,490,231	0	0.0
<b>F. Educación</b>					
2	Construcción y equipamiento de la Institución Educativa N° 14325 nivel primaria - Reverendo Padre Miguel Anselmo Córdova Chumacero, distrito de Frías, provincia de Ayabaca	386,420	386,420	0	0.0
2	Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la Institución Educativa Túpac Amaru, distrito de Frías, provincia de Ayabaca	386,420	386,420	0	0.0

Fuente: Boletín de Vigilancia N° 2: Presupuesto Participativo Regional 2009 - Piura. CIPCA - Vigila Perú. Julio 2009.

## Anexo 2: Proyectos Calificados en el Proceso de Presupuesto Participativo Regional de Piura 2009

COD SNIP	PRIO-RIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	LOCALIDADES BENEFICIADAS	COSTO ESTIMADO
36420	7	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE. N 15512 ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	PARIÑAS	DESARROLLO DE CAPACIDADES	TALARA ALTA	1,980,936
36970	7	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE 15510 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	PARIÑAS	DESARROLLO DE CAPACIDADES	CERCADO DE TALARA	1,630,130
37575	7	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 14917 MICAELA BASTIDAS MÁNCORA	MÁNCORA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Calle Micaela Bastidas S/N	1,918,203
52207	9	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DISCIPLINAS DEPORTIVAS LA DRAGA, DISTRITO DE LA BREA - TALARA - PIURA (1/)	LA BREA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	SECTOR LA DRAGA	1,990,020

COD SNIP	PRIORIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	LOCALIDADES BENEFICIADAS	COSTO ESTIMADO
74245	6	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IEº MARISCAL CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	COLAN	DESARROLLO DE CAPACIDADES	PUEBLO NUEVO DE COLAN	1,404,737
74205	6	AMPLIACION ,REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA IE Nº 14754 JUANA ROSA LAZO TALLEDO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	COLAN	DESARROLLO DE CAPACIDADES	PUEBLO NUEVO DE COLAN	1,388,091
70738	4	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14079 - DIVINO MAESTRO - SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	SECHURA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	SECHURA	2,105,847
45419	4	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 15023, DEL PUEBLO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPÓN	BUENOS AIRES	DESARROLLO DE CAPACIDADES	BUENOS AIRES	2,341,703
67421	9	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MELANIO COLOMA CALDERON, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA	BELLAVISTA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI	3,650,987
81047	4	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 15027 "AMAUTA" DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	SULLANA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	SULLANA	1,494,302
77860	7	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 14793 LUCIANO CASTILLO COLONNA BELLAVISTA - SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	SULLANA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	SULLANA	1,737,806
78985	6	AMPLIACION , REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA IE Nº 14767, DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	TAMARINDO	DESARROLLO DE CAPACIDADES	TAMARINDO	1,448,948
69170	3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NECESARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" EN EL CASERÍO PAMPA ELERA ALTA- DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	LAS LOMAS	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Caserío Pampa Elera Alta	1,391,287
83621	3	MEJORAMIENTO ,AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N 14146 DEL CENTRO POBLADO LA PEÑITA DEL , DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA	TAMBOGRANDE	DESARROLLO DE CAPACIDADES	LA PEÑITA	1,131,272
33452	8	AMPLIACION DEL ESTADIO FAUSTINO LADINES GRANDA EN EL DISTRITO DE TAMARINDO, PROVINCIA DE PAITA - PIURA (1/.)	TAMARINDO	DESARROLLO DE CAPACIDADES	TAMARINDO	1,395,267
69171	3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NECESARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 15316 DEL SECTOR EL SAUCE- DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	LAS LOMAS	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Caserío El Sauce	1,044,469

COD SNIP	PRIORIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	LOCALIDADES BENEFICIADAS	COSTO ESTIMADO
69174	3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NECESARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15297 EN EL CASERÍO PAMPA ELERA BAJA- DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	LAS LOMAS	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Caserío Pampa Elera Baja	1,012,134
27151	4	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N° 49 DEL AA.HH. LUIS PAREDES MACEDA DISTRITO DE PIURA	PIURA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	AA.HH. Luis Paredes Maceda	1,104,430
32449	4	CONSTRUCCION DE CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA LAS CAPULLANAS CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	CURA MORI	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Chato Grande	1,076,850
49390	5	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 14007 URBANIZACION PIURA - DISTRITO DE PIURA - PIURA	PIURA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	URBANIZACION PIURA	1,460,548
74943	2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 14126 CASERIO VICHAYAL - DISTRITO LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	LA ARENA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	CASERIO VICHAYAL	1,918,752
86569	1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E N° 14063 – MONTE REDONDO, DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DE PIURA	LA UNIÓN	DESARROLLO DE CAPACIDADES	MONTE REDONDO	2,331,238
67481	2	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA	FRIAS	DESARROLLO DE CAPACIDADES	FRIAS	3,059,292
67502	2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14325 NIVEL PRIMARIA - REVERENDO PADRE MIGUEL ANCELMO CORDOVA CHUMACERO, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA	FRIAS	DESARROLLO DE CAPACIDADES	FRIAS	2,496,390
47712	3	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN MARTÍN, DEL CASERÍO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	HUARMACA	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Nuevo San Martín	1,680,232
64560	3	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "EMILIO ESPINOZA" - CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	CANCHAQUE	DESARROLLO DE CAPACIDADES	CANCHAQUE	3,973,753
79096	1	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLICUAR-PROGRESIVA KM. 3+385 AL KM. 7+385 - DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	RINCONADA LLICUAR	DESARROLLO ECONÓMICO	Rinconada, Dos Pueblos y Llicuar	3,790,551
77294	1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RIEGO MENOR EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	BELLAVISTA DE LA UNION	DESARROLLO ECONÓMICO	BELLAVISTA DE LA UNION	4,389,479

COD SNIP	PRIORIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	LOCALIDADES BENEFICIADAS	COSTO ESTIMADO
58147	2	MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO CARMEN BENITEZ, LETIRA GRANDE, LETIRA CHICO DEL DISTRITO DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	VICE	DESARROLLO ECONÓMICO	VICE	1,976,130
36604	3	REHABILITACION DEL MUELLE FISCAL DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	PAITA	DESARROLLO ECONÓMICO	PAITA	1,866,494
50918	1	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZOS IRHS 220 1 –323-354-360-446-447-631-684-70 SECTOR YAPATERA	CHULUCANAS	DESARROLLO ECONÓMICO	YAPATERA	1,395,306
50950	1	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZOS IRHS 20-24-25-27-35-40-152-189-190-224-771-812-813-838-842 SECTOR CHARANAL	CHULUCANAS	DESARROLLO ECONÓMICO	CHARANAL	2,356,376
43377	1	REACONDICIONAMIENTO DE CAJA Y AMPLIACION DE ALCANTARILLAS EN EL DREN CIENEGUILLO CENTRO - SULLANA	SULLANA	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENEGUILLO CENTRO	1,033,227
60178	1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL JIBITO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHIRA - DISTRITO MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA	MIGUEL CHECA	DESARROLLO ECONÓMICO	JIBITO	2,052,632
72659	3	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PUERTO RICO – BAYOVAR - SECHURA	SECHURA	DESARROLLO SOCIAL	PUERTO RICO	2,215,522
25189	7	CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500M3 VILLA LOS ANGELES, TALARA ALTA, TALARA	PARIÑAS	DESARROLLO SOCIAL	TALARA ALTA	5,471,233
50867	3	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE LOS POZOS DE CAPTACION Y REHABILITACION DE LOS RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA QUEBRADA FERNANDES - BARRANCOS - MANCORA, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	MÁNCORA	DESARROLLO SOCIAL	BARRANCOS	1,999,662
53371	8	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	PAITA	DESARROLLO SOCIAL	PAITA	61,304,028
74250	6	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ESMERALDA, LOCALIDAD DE SAN LUCAS DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	COLAN	DESARROLLO SOCIAL	PUEBLO NUEVO DE COLAN	3,173,459
27289	9	CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE SECHURA	SECHURA	DESARROLLO SOCIAL	Sechura	1,958,317
10272	2	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS DE FRONTERA NORTE DEL PERÚ. DISTRITO LA MATANZA, LOCALIDADES: KM 62, KM 65, KM 66, LA ANCAJIMA, HISPON, TONGO Y AH. LA MATANZA	LA MATANZA	DESARROLLO SOCIAL	Km. 62, Km. 65, Km 66, La Ancajima, Hispon, Tingo, AH. La Matan	1,359,993

COD SNIP	PRIORIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	LOCALIDADES BENEFICIADAS	COSTO ESTIMADO
41384	3	AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 SAN JUAN DE BIGOTE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, EN LA PROVINCIA DE MORROPON - REGION PIURA	SAN JUAN DE BIGOTE	DESARROLLO SOCIAL	San Juan de Bigote	1,184,887
60686	2	SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE PROGRESO ALTO, PROGRESO BAJO Y PUNTA ARENAS DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA DE PIURA	TAMBOGRANDE	DESARROLLO SOCIAL	CENTROS POBLADOS DE PROGRESO ALTO, PROGRESO BAJO Y PUNTA ARENA	2,669,271
51971	1	ELECTRIFICACIÓN CASERIO CP 2 COLERA - TAMBOGRANDE	TAMBOGRANDE	DESARROLLO SOCIAL	CP 2 COLERA	1,397,243
54120	1	ELECTRIFICACIÓN CP SAN MARTIN CP 3 -TAMBOGRANDE	TAMBOGRANDE	DESARROLLO SOCIAL	CP SAN MARTIN CP 3	5,031,226
8566	1	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD LA UNIÓN	LA UNIÓN	DESARROLLO SOCIAL	La Union	1,383,161
29372	5	AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA JULIA - DISTRITO DE PIURA	PIURA	DESARROLLO SOCIAL	Santa Julia	1,870,300
35449	5	REMODELACION, REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN PEDRO - CLAS SAN MIGUEL - DISTRITO DE PIURA	PIURA	DESARROLLO SOCIAL	PIURA	1,819,068
63161	5	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 LOS ALGARROBOS-REGION PIURA	PIURA	DESARROLLO SOCIAL	AA.HH. Los Algarrobos	2,008,030
43736	7	INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN ENACE III Y IV ETAPA Y EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	PIURA	DESARROLLO SOCIAL	Enace III y IV Etapa-A.H. Villa Hermosa	7,768,766
29969	5	ELECTRIFICACION DE LOS CASERIOS RIO VIEJO, ALTO DE LOS CARRILLOS, EL CONDOR, RIO VIEJO SUR, ALTO DE LA CRUZ Y CENTRO POBLADO DE CASAGRANDE	LA ARENA	DESARROLLO SOCIAL	Caseríos Rio Viejo Norte, Alto de los Carrillos, El Cóndor, Río Viejo Sur, Alto de la Cruz y Centro poblado de Casagrand	1,146,079
56326	3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE PACAIPAMPA - DISTRITO DE PACAIPAMPA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	PACAIPAMPA	DESARROLLO SOCIAL	PACAIPAMPA	3,649,217
33608	3	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE, HUAYANAY Y HUANDO BAJO	SAN MIGUEL DEL FAIQUE	DESARROLLO SOCIAL	San Miguel de El Faique, Pampa Alegre, Huayanay y Huando Bajo	5,560,983

COD SNIP	PRIORIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	LOCALIDADES BENEFICIADAS	COSTO ESTIMADO
78012	3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAPALACHE, DISTRITO DE CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	CARMEN DE LA FRONTERA	DESARROLLO SOCIAL	Sapalache	1,950,365
27506	3	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO DOMINGO, MORROPON - PIURA	SANTO DOMINGO	DESARROLLO SOCIAL	Santo Domingo	2,258,834
82137	3	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE NUEVO AMANECER, POCLUS ALTO, COFRADÍA Y LAS PIRCAS DEL DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	FRIAS	DESARROLLO SOCIAL	LAS PIRCAS, ALTO POCLUS, COFRADIA Y NUEVO AMANECER	1,080,714
54713	3	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE OXAHUAY-SICCHEZ-AYABACA-PIURA	SICCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	OXAHUAY	1,905,145
80840	4	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO A PLAYA LAS PEÑITAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	PARIÑAS	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	LAS PEÑITAS	1,617,332
70878	2	MEJORAMIENTO DE VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	SECHURA	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	Ciudad de Sechura	5,529,867
34852	2	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AH. LAS MERCEDES, PROVINCIA DE TALARA - PIURA	PARIÑAS	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	AH. LAS MERCEDES	1,997,628
71661	2	MEJORAMIENTO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO PIURA TRAMO SECTOR LA MARIPOSA - CACHO DEL TORO - DEL DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	CRISTO NOS VALGA	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CRISTO NOS VALGA	2,779,569
30653	3	REHABILITACION DE ACCESOS Y MEJORAMIENTO DE PLAYAS PAITA	PAITA	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	Paíta	2,363,145
43468	2	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA EL RIEGO DE LOS SECTORES: YAPATERA, CHARANAL, SANCOR Y VICUS, DISTRITO CHULUCANAS., PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	CHULUCANAS	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	SECTORES YAPATERA, CHARANAL, SANCOR Y VICUS	3,341,324
27104	2	MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES HUANGALA Y ANEXOS DEL ALTO CHIRA - SULLANA	SULLANA	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	HUANGALA - ALTO CHIRA	1,793,452
67847	3	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALLARES-CENTRO POBLADO EL ANGOLO-DISTRITO DE MERCANELICA-PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	MARCAVELICA	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MALLARES, SAMAN, LA NORIA, CAÑAS, SAN JACINTO, EL ANGOLO	17,865,942
35401	3	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A BELIZARIO Y ANEXOS, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	SECHURA	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	Caserío de Belizario y Anexos	1,496,919

COD SNIP	PRIORIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	LOCALIDADES BENEFICIADAS	COSTO ESTIMADO
54549	1	CARRETERA LA UNION MONTERREDONDO LA UNION	LA UNIÓN	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	LA UNION - VILLA MONTERREDONDO	2,145,180
62383	1	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE JAMBUR -PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	PAIMAS	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	JAMBUR	2,597,888
22891	2	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE NANGAY DE MATALACAS - SAUSAL DEL QUIROZ	PACAI PAMPA	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	NANGAY DE MATALACAS, CERRO BLANCO Y SAUSAL DEL QUIROZ	2,856,077
51459	2	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SUYO PAMPA LARGA SUYO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	SUYO	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	PAMPA LARGA	1,389,864
22903	2	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CULCAPAMPA - CARRIZAL - TAPAL BAJO	AYABACA	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CULCAPAMPA, LA LAGUNA, TALAL, SINVACA, SACALLA, CARRIZAL Y TAPAL BAJO	1,207,929

Fuente: Gobierno Regional de Piura
